

1.0 Información General

- 1.10. Nombre del Proyecto: Centro Comercial Plaza Mundo Apopa
- 1.20. Ubicación: Carretera Troncal del Norte CA04, Km 11 ½, municipio de Apopa, De
- 1.30. Destino del proyecto: Comercial
- 1.40. Componentes del proyecto: Edificios de 2 niveles de locales comerciales, edificio de estacionamientos, foodcourt y anfiteatro, pasarelas sobre carretera Troncal del Norte, túnel bajo carretera Troncal del Norte, área de estacionamiento complementaria en costado oriente de carretera Troncal del Norte

2.0 Información Contractual

2.10. Profesionales asignados al proyecto:

Supervisión General:	Gestas	Diseño estructural:	EC Consultores
Supervisión Estructural:	EC Consultores	Contratista Obra Civil	NABLA
Administrador del proyecto:	Gestas	Administrador Subcontratos:	NABLA
Diseño arquitectónico:	Espitia Barrachina		

2.30 Garantías y Seguros del proyecto

Garantía de Fiel Cumplimiento y Pagaré de fondo rotativo
Seguro Todo Riesgo de Construcción

3.0 Información sobre el Avance de Obra


3.10 Tiempo transcurrido y restante

Plazo original:	406 días calendario
Plazo prórroga:	pendiente por situación COVID-19
Tiempo transcurrido:	557 días calendario
Tiempo restante:	pendiente por situación COVID-19

3.20 Avance del proyecto

Avance físico de la obra programado:	100%
Avance físico de la obra ejecutado:	93%

4.0 Programa de Obra

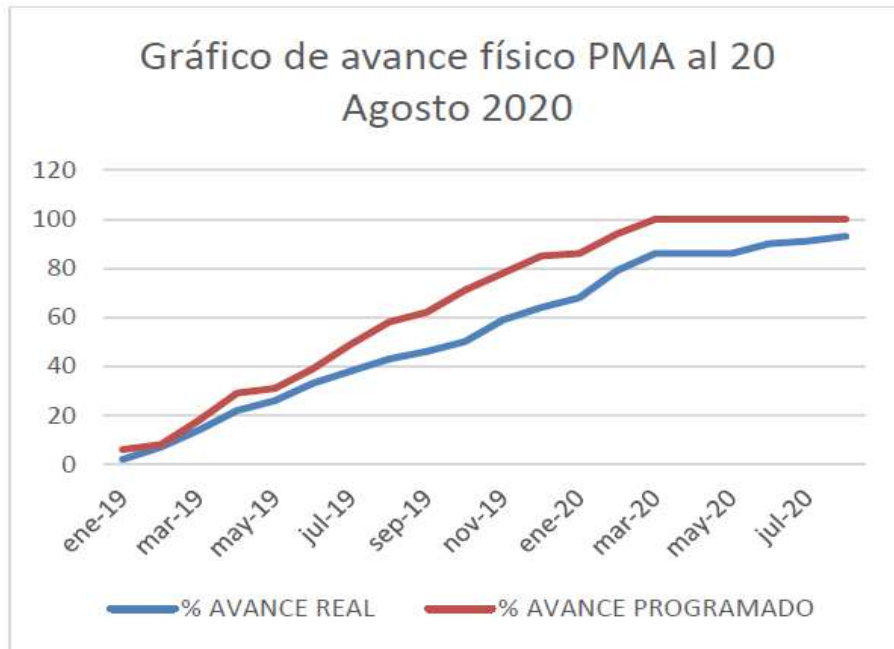

5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

EMPRESA CONTRATISTA	CANTIDAD DE PERSONAL
CONSTRUCCIONES NABLA	78
ACEROS ARQUITECTONICOS	7
CORTEN	59
FHC	49
DURMAN	9
SOLAIRE	5
LUANFRA	7
DIMARTI	7
ENERSYS	18
LUX INGENIEROS	75
INGINTERO	3
ESTRUCTURAS PINTO	13
PREFINSA	62
GAMA	13
ESTRUCTURAS FISCHNAYLER	6
SIEMENS	4
CE	3
COPLA	6
SHERWIN WILLIAMS	3
AC	2
INPELEC	2
IBW	4
TORNOLARA	6
KLIMAS	3
CONSTRUTEC	1
LUJO	6
ITEM TROPIGAS	1
COREYSA	4
TOTAL	462
